THACO

BÁO CÁO NGÀY
DAILY REPORT

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP.HCM - Tuyến Bến Thành - Tham Lương

Mã tài liệu | Doc. code	**HCM2_1-23_CS-THAC_DCEM-CPZZ-ST01-CWS-DRP-00001**		
Vị trí | Location	ST01	**Số BCN** | Report no.	00001
Đơn vị thi công | Subcontractor	THAC_CRSG, THAC_THAN	**Ngày** | Date	10/11/2026

I. THÔNG TIN CHUNG & THỜI TIẾT | GENERAL & WEATHER

Sáng 08h-16h *Morning*	Chiều 16h-24h *Afternoon*	Tối 00h-08h *Night*	Giờ ngừng do thời tiết *Hrs lost*	Chỉ số đánh giá *Value*
Nắng	Mưa	Bão	1,5	SV | EV | AC

II. AN TOÀN – CHẤT LƯỢNG – CHỈ THỊ TVGS | HSE – QUALITY – ENGINEER'S INSTRUCTIONS

Sự cố HSE *HSE incidents*	Sự cố môi trường *Environmental incidents*	Kiểm tra ATLĐ *HSE inspections*	Nghiệm thu (IR) *Inspection request*	NCR mới *New NCR*
0	0	3	2	0

Mô tả sự cố | Incident details: Không có

Chỉ thị / ý kiến TVGS | Engineer's instructions: TVGS yêu cầu kiểm tra dung dịch trước khi hạ lồng thép

III. SỰ KIỆN TRONG NGÀY | EVENT LOGS

Mã sự kiện *Event ID*	Loại sự kiện *Type*	Nội dung *Description*	Hạn xử lý *Due*	Trạng thái *Status*	Ghi chú *Remarks*
EVT-ST01-00001	KIEM_TRA_ATLD	3 lượt kiểm tra hiện trường (cẩu, hố đào, điện)	22/11/2026	**Đạt**	
EVT-ST01-00002	NGHIEM_THU	Nghiệm thu lồng thép tấm P-12	26/11/2026	Không Đạt	
EVT-ST01-00003	CHI_THI_TVGS	Bổ sung biên bản kiểm tra dung dịch bentonite tấm P-12	24/11/2026	**Đạt**	
EVT-ST01-00004	NGHIEM_THU	Nghiệm thu hố đào tấm P-12 trước đổ BT	25/11/2026	Không Đạt	

Tóm tắt | Summary:

IV. KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN | WORK QUANTITIES

Activity ID (P6) *Activity ID*	Cấu kiện *Element*	Công việc *Step*	ĐV *Unit*	Ngày bắt đầu *Start*	Ngày kết thúc *Finish*	Thực hiện hôm nay *Daily Actual*	Luỹ kế hôm qua *Prev. Cum.*	Tổng phải làm *Planned Qty*	Tiến độ *Progress (%)*	Ghi chú *Remark*
CV-ST01-00001	Tấm tường vây số 01	DWL-01 Đào	m³	22/11/2026	25/11/2026	100	500	1.000	60	
CV-ST01-00001	Tấm tường vây số 01	DWL-02 Hạ lồng thép	tấn	22/11/2026	25/11/2026	100	400	2.000	25	
CV-ST01-00001	Tấm tường vây số 02	DWL-03 Đổ bê tông	m³	12/11/2026	25/11/2026	100	500	1.000	60	6 tổ mẫu
---	Đường dẫn	GWL-01 Tường dẫn	m	12/11/2026	25/11/2026	100	400	2.000	25	Chờ ván khuôn

Tóm tắt | Summary:

V. VẬT TƯ | MATERIALS

Mã vật tư *Mat. ID*	Vật tư *Material*	ĐV *Unit*	Nhập về trong ngày *Recv.*	Nhà cung cấp *Supplier*	Ghi chú *Remark*
MAT-ST01-00001	Bê tông C35/45	m³	214	Thiên An	
MAT-ST01-00002	Thép D32	tấn	32	Hoà Phát	
---	Bentonite	tấn	4	Thaco	MAS chờ PICC

Tóm tắt | Summary:

VI. NHÂN LỰC | MANPOWER

Mã Resource *Resource ID*	Loại *Category*	Số người hôm nay *Daily Actual*	Luỹ kế hôm qua *Prev. Cum.*	Tổng hiện nay *Cum. Total*	Ghi chú *Remark*
RES-HUM-00001	Chỉ huy trưởng	8	100	108	
RES-HUM-00002	Giám sát hiện trường	14	0	14	
RES-HUM-00003	Công nhân kỹ thuật	52	0	52	
RES-HUM-00004	Lao động phổ thông	30	0	30	
RES-HUM-00005	An toàn viên	6	0	6	
RES-HUM-00006	Vận hành máy	4	0	4	
Tổng | Total		**114**	**100**	**214**	

Tóm tắt | Summary:

VII. THIẾT BỊ | EQUIPMENT

Mã tài nguyên *Res ID*	Thiết bị / biển số *Equipment*	Số lượng *Qty*	Tình trạng *Status*	Activity ID (P6) *Activity ID*
RES-EQP-00001	Cẩu bánh xích 80T	1	**Active**	CV-ST01-00001
RES-EQP-00003	Gầu ngoạm tường vây	1	**Active**	CV-ST01-00001
RES-EQP-00004	Trạm trộn / tái sinh bentonite	1	**Active**	CV-ST01-00002
RES-EQP-00005	Máy đào 0,7 m³	2	**Active**	CV-ST01-00002
RES-EQP-00002	Xe bồn bê tông 7 m³	6	**Active**	---
RES-EQP-00006	Máy phát điện 250 kVA	1	**Pending**	---

Tóm tắt | Summary:

VIII. VƯỚNG MẮC / RÀNG BUỘC ĐANG MỞ | OPEN ISSUES & CONSTRAINTS

Activity ID (P6) *Activity ID*	Mã vướng mắc *Issue ID*	Nội dung *Description*	Mức độ *Severity*	Bên xử lý *Owner*	Phát sinh *Raised*	Hạn *Due*	Trạng thái *Status*	Cập nhật hôm nay *Today update*
CV-ST01-00001	ISS-ST01-00001	Cọc secant lấn ranh 300–450 mm cạnh Đông – chờ phương án thiết kế	**Cao**	THAC_DDEM	15/10/2026	28/10/2026	**Đang xử lý**	TK đã gửi phương án sơ bộ, chờ CICE
CV-ST01-00002	ISS-ST01-00002	Phê duyệt NCC bentonite mới – tồn 4 ngày	**Cao**	THAC_DPRC	20/10/2026	27/10/2026	**Mở**	---
CV-ST01-00001	ISS-ST01-00003	Cáp ngầm chưa xác định tại trục 9 – dò tìm trước khi đào tường dẫn	**Thấp**	Site + EVNHCMC	22/10/2026	30/10/2026	**Mở**	---
---	ISS-ST01-00004	Thiếu mặt bằng tập kết lồng thép do phân luồng GĐ2	**Trung bình**	MAUR_PMU2	18/10/2026	05/11/2026	**Đóng**	---


Tóm tắt | Summary:

IX. ẢNH HIỆN TRƯỜNG | SITE PHOTOS

BỘ PHẬN DCEM



img1.jpeg

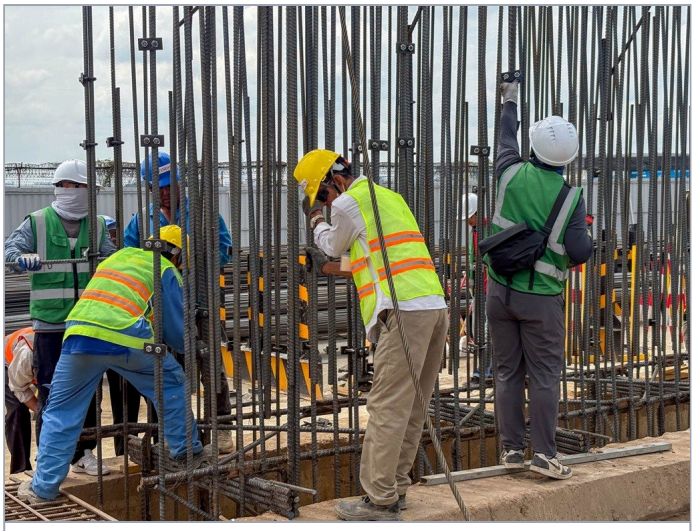

img2.jpeg



img3.jpeg

Tóm tắt | Summary: Hố đào tấm P-12

BỘ PHẬN HSE



img4.jpeg



img5.jpeg



img6.jpeg

Tóm tắt | Summary: Kiểm tra an toàn hiện trường

X. THÔNG TIN KÝ DUYỆT | SIGN-OFF

Người lập *Prepared by*	**Trưởng ga / CHT** *Site manager*
user@example.com	

XI. CHỈ ĐẠO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH | MANAGEMENT DIRECTIVES

Sinh tự động từ Microsoft 365 (SharePoint)
Ảnh: data/ST01/DailyReport_20261110/photos/ | Template version: template_DRP_ST01_20261113
